永德县书香苑小区二期“9·18”一般窒息事故

调查报告

永德县人民政府“9·18”事故调查组

2025年11月19日

目录

一、 事故基本情况 2
（一）项目基本概况 2
（二）事故相关单位概况 3
（三）项目安全管理情况 7
（四）施工安全监管责任单位情况 10
（五）事故发生经过 11
（六）事故现场情况 12
（七）人员伤亡情况 12
二、 事故应急处置及评估情况 13
（一） 事故信息接报及响应情况 13
（二） 事故现场应急处置情况 13
（三） 医疗救治和善后情况 14
（四） 事故应急处置评估 14
三、 事故原因分析 14
（一）事故直接原因 14
（二）事故间接原因 14
四、 有关责任单位存在的主要问题 15
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议 18
（一）对责任单位的处理建议 18
（二）对责任人的处理建议 20
（三）对监管部门的处理建议 24

六、 事故主要教训 24
七、 事故整改和防范措施 27

永德县书香苑小区二期
“9·18”一般窒息事故调查报告

永德县人民政府：

2025年9月18日15时40分，云南省临沧市永德县在建的永德县书香苑小区二期工程项目发生一起工人坠入桩孔，造成1人窒息死亡事故，事故直接经济损失128万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规的规定，9月19日，永德县人民政府成立由县委常委、县人民政府常务副县长陈阳任组长，县人民政府办公室副主任郭健、县应急管理局局长杜永福任副组长，县应急管理局、县住房和城乡建设局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、德党镇有关负责同志参加的永德县书香苑小区二期“9·18”一般窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了地方党委、政府、有关部门和企业存在的问题，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议、事故整改和防范措施建议。

事故调查组认定，永德县书香苑小区二期“9·18”一般窒息事故是一起违反操作规程、冒险作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本概况

永德县教育园区商业街开发项目于2015年6月取得投资备案证《永政发改投资备案〔2015〕75号》，备案项目编号为15530923*****75。根据备案文件，项目位于永德县永新路和纬一路两侧，总用地面积70323.86平方米，建筑面积208263平方米，机动车位970个。其中：建设住宅567户93324.44平方米，商铺52091.07平方米，专家楼7502.6平方米，校史馆3771.04平方米，青少年校外活动中心4105.92平方米及其它用房20794.03平方米，项目总投资67022.4万元。（该项目分为两期，一期已竣工投入使用）

该项目于2015年12月9日，取得永德县住房和城乡建设局核发的《建设用地规划许可证》，地字第530923*****19，用地单位：永德县教育局，编号：云地№0*****49。2025年3月12日，取得永德县自然资源局核发的《不动产权证书》，权利人：永德县合兴房地产开发有限公司，编号：№530*****86。2025年7月3日，取得永德县自然资源局核发的《建设工程规划许可证》，建字第永德县20*****07，电子监管号：530923*****62，建设单位：永德县合兴房地产开发有限公司。2025年7月9日，取得云南省住房和城乡建设厅《房屋建筑和市政基础设施工程勘

察文件施工图审查合格书》，编号：125*****31。2025年7月10日，取得云南汇邦设计（院）有限公司《房屋建筑和市政基础设施工程设计文件施工图审查合格书》，编号：225*****32。2025年8月13日，取得永德县住房和城乡建设局核发的《建设工程施工许可证》，编号：30923*****01。

发生事故涉及的为永德县书香苑小区二期项目，建设6栋主体建筑，属于教育园区六号地块项目，是永德县教育园区商业街开发项目的子项目，属于房地产开发项目。规划用地面积约14亩，总建筑面积为26939.34平方米，事故发生现场具体位置位于该子项目5#楼地基基础的57号桩孔，5#栋建筑面积：4894.78平方米[1]。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位：永德县合兴房地产开发有限公司。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：张某云。注册资本：贰仟捌佰捌拾万元整。成立日期：2014年9月11日。注册地址：云南省临沧市永德县。经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋出租；场地租赁；农副产品购销；农贸市场开发、建设、管理；家用电器销售。（依法须经批准的项目，经项目部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：永德县市场监督管理局。

1 1#栋建筑面积：5634.72平方米，2#栋建筑面积：2825.72平方米，3#栋建筑面积：772.44平方米，4#栋建筑面积：4392.46平方米，5#栋建筑面积：4894.78平方米，6#栋建筑面积：3445.1平方米，计容建筑面积为21084.79平方米（其中住宅建筑面积19054.08平方米，商业建筑面积为1729.16平方米，社区居家养老建筑面积为301.55平方米），不计容建筑面积为5854.55平方米（停车位面积为5819.73平方米，公共厕所面积为34.82平方米），容积率为22.6%，建筑密度为29.61%，绿地率为35.21%合同工期：总合同工期540天，计划开工日期2025年6月10日。2025年6月初，该子项目开始进行进出场道路硬化、水电管网布置、现场围挡、扬尘治理冲洗池建设等施工前的准备工作，2025年8月14日开始主体工程施工。

登记时间：2023年10月24日。公司持有《房地产开发企业资质证书》[2]

2.施工单位：云南远雄建设有限公司。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：胡某松；注册资本：肆仟万元整；成立日期：2022年3月21日；注册地址：云南省临沧市永德县；经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装修装饰；建筑劳务分包；建设工程设计、建设工程监理；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。登记时间：2024年1月23日。登记机关：永德县市场监督管理局；公司持有《安全生产许可证》[3]《建筑企业资质证书》[4]。

3.监理单位：云南吉吉鑫项目管理有限公司。曾用名：永德县吉鑫建设监理有限责任公司、云南吉吉鑫建设监理有限责任公司；注册地址：云南省临沧市永德县德党镇；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：纪某安；注册资本：壹佰万元整；经营范围：许可项目；建设工程监理。（依法须经批

2《房地产开发企业资质证书》有效期至2028年09月02日；资质等级：二级；发证机关：临沧市住房和城乡建设局；发证时间：2025年07月18日。

3《安全生产许可证》许可范围：建筑施工；有效期：2023年03月21日至2026年03月31日；发证机关：云南省住房和城乡建设厅；发证2023年03月31日。

4《建筑业企业资质证书》有效期：2027年11月29日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级（有效期至2028年07月07日）、市政公用工程施工总承包贰级（有效期至2028年07月07日）、特种工程（结构补强）专业承包不分等级（有效期至：2027年11月29日）；发证机关：云南省住房和城乡建设厅，签发日期：2024年03月19日。

准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。成立日期：2003年11月24日；登记日期：2025年1月21日登记机关：永德县市场监督管理局。公司持有《工程监理资质证书》[5]。

4.勘察单位：河北益坤岩土工程新技术有限公司。注册资本：贰仟零伍拾万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：李某海。许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；测绘服务；建设工程设计；劳务派遣服务；建筑劳务分包；施工专业作业；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工，工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；环境保护监测；地理遥感信息服务；土地调查评估服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；工程造价咨询业务；水文服务；地质灾害治理服务；市政设施管理；基础地质勘查；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、

5 《工程监理资质证书》企业名称：云南吉吉盘项目管理有限公司；成立时间：2003年11月24日；有效日期：2030年06月30日；经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：纪某安、担任职务：董事长；单位负责人：纪某安、担任职务：董事长；技术负责人：段某1、职称：高级工程师；业务范围：房屋建筑工程专业资质乙级（合格，有效期至：2030年06月30日）、市政公用工程专业资质乙级（合格，有效前至：2030年06月30日）；发证机关：临沧市住房和城乡建设局；签发日期：2025年02月27日。

监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册地址：河北省石家庄市裕华区；成立日期：2004年11月03日；登记机关：石家庄市裕华区行政审批局；登记日期：2023年4月10日。公司持有《工程勘察资质证书》[6]《乙级测绘资质证书》[7]。

5.设计单位：华森工程科技集团有限公司。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李某1；经营范围：岩土工程（勘察、设计、物探测试检测监测），水文地质勘察，工程钻探，凿井，工程项目管理，工程咨询，工程造价，工程招标代理，政府采购代理；建设工程总承包，建筑工程，市政公用工程，公路工程，农业林业工程，地基基础工程，电子与智能化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，桥梁工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，建筑机电安装工程，建筑幕墙工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，环保工程，特种工程，风景园林工程，修缮维护与加固工程；测绘，城乡规划，工程设计，工业设计，图形设计，施工图审查，建筑材料：房屋拆除，安全技术防范工程设计、施工、维修；劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本伍仟万元整；成立日期：2010年11月22日；营业期限：2010年11月22日

6《工程勘察资质证书》名称：河北益坤岩土工程新技术有限公司；法定代表人：李某海，职务：董事长；单位负责人：朱某温，职务：总经理；技术负责人：白某某，职称或职业资格：注册土木工程师（岩土）；性质：有限责任公司（其它）；有效期至：2030年03月09日；范围：工程勘察专业类岩土工程物探测试检测监测乙级，工程勘察专业类岩土工程设计乙级，工程勘察专业类工程测量乙级。发证机关：河北省住房和城乡建设厅；发证时间：2025年4月14日。

7《乙级测绘资质证书》专业类别：乙级：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。单位名称：河北益坤岩土工程新技术有限公司；法定代表人：李某海；有效期至：2026年11月4日；发证机关：河北省自然资源厅；发证时间：2021年11月5日。

至2060年11月21日；注册地址：云南省昭通市昭阳区；发证机关：昭通市市场监督管理局；发证时间：2020年6月1日。公司持有《工程设计资质证书》[8]。

（三）项目安全管理情况

事故发生现场具体位置位于该子项目5#楼地基基础，该基础设计81个桩孔，事故发生于57号桩孔，《旋挖钻孔灌注桩专项施工方案》要求“始终将施工安全放在首位，建立健全安全管理体系，制定完善的安全技术措施和应急预案，强化安全教育培训，落实安全责任制度，对施工现场的危险源进行全面辨识和管控，确保施工人员生命安全和工程结构安全。”

1.建设单位：永德县合兴房地产开发有限公司

法定代表人为张某云，永德县书香苑小区二期项目项目负责人为孙小兵，根据《云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施》[9]的要求履行“严格落实建设单位安全生产首要责任”。

经查，永德县书香苑小区二期项目存在先开工建设后补办基本建设程序情况。

2.勘察单位：河北益坤岩土工程新技术有限公司

法定代表人：李某1，项目负责人：朱某温。

经查，河北益坤岩土工程新技术有限公司于2025年5月出

8《工程设计资质证书》有效期：至2028年12月11日；企业名称：华森工程科技集团有限公司；经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证时间：2023年12月11日。

9《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》（云建质〔2023〕1号）。

具《永德县书香苑小区二期岩土工程勘察报告》，并经云南汇邦设计（院）有限公司审查合格，2025年7月9日出具永德县书香苑小区二期《房屋建筑和市政基础设施勘察文件施工图审查合格书》，未发现违反基本建设程序情况。

3.设计单位：华森工程科技集团有限公司

法定代表人李某1，项目负责人王某军。

经查，2025年7月，华森工程科技集团有限公司对永德县书香苑小区二期设计文件报云南汇邦设计（院）有限公司审查，2025年7月10日，云南汇邦设计（院）有限公司出具永德县书香苑小区二期《房屋建筑和市政基础设施设计文件施工图审查合格书》，未发现违反基本建设程序情况。

4.施工单位：云南远雄建设有限公司

公司成立项目部，履行“严格落实建设单位安全生产主体责任”。以项目经理为组长的施工领导小组，全面负责工程的施工组织、协调和管理工作。下设技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员等岗位，明确各岗位职责，确保施工过程有序进行。法定代表人为胡某松（资质：《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》[10]），项目经理为张某辉，项目专职安全生产管理人员为李某琴（资质：《安全生产考核合格证书》[11]）、李某2（资质：《安全生产考核合格证书》[12]），项目工地旋挖桩

10 《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》初次领证日期：2022年11月15日；有效期：2024年03月13日至2025年11月15日；发证机关：云南省住房和城乡建设厅；发证日期：2024年03月13日。

11 《建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》初次领证日期：2020年10月30日；有效期：2024年03月09日至2026年05月31日；发证机关：云南省住房和城乡建设厅；发证日期：2024年03月09日。

12 《建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》初次领证日期：2023年04月12日；有效期：2025年08月29日至2026年05月31日；发证机关：云南省住房和城乡建设厅；发证日期：2025年08月29日。

基组班组长为魏某江。

经查，公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度以及相关岗位人员安全生产操作规程，项目专职安全生产管理人员、机械员存在现场施工不在岗、不履职；施工安全三级教育不到位（班组施工安全教育不到位）。施工单位项目部有令不止，临沧市住房和城乡建设局下发临住建通〔2025〕9-3-1号（永德）建设工程质量安全隐患整改通知书、临住建执〔2025〕9-3-1号（永德）执法建议书。建筑工人安全意识淡薄，违规冒险作业，汽车吊司机未落实十不吊操作规程（严禁用固定吊载运人员）。

5.监理单位：云南吉吉鑫项目管理有限公司

法定代表人纪某安，项目总监段某1（资质：《云南省专业技术职称证书》[13]、《监理工程师注册证书》[14]），项目监理员段某2（资质：《工程师资格证书》[15]、《云南省建设监理业务培训合格证书》[16]）。

经查，在永德县书香苑小区二期项目建设过程中，对项目的监理工作存在不到位的情况，如2025年9月16日给施工单位发出施工暂停令（局部暂停令）后，有令不止，发现施工单位9月

---

13 《云南省专业技术职称证书》资格名称：高级工程师；职称级别：副高级；职称系列：工程技术人员；专业名称：建筑工程/工程监理；取得时间：20220930；评审组织：云南省建筑工程高级职称评审委员会；发证机关：云南省人力资源和社会保障厅。

14 《监理工程师注册证书》注册执业单位：云南吉吉鑫项目管理有限公司；注册有效期：2027年01月27日；注册专业：房屋建筑工程、市政公用工程；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2023年11月16日。

15 《工程师资格证书》专业名称：建筑工程；资格名称：工程师；评审组织：临沧市建设工程系列中级专业技术评委会；资格认定时间：2015.12.11；发证时间：2015.12.30。

16 《云南省建设监理业务培训合格证书》所在单位：永德县吉鑫建设监理有限责任公司；发证日期：2019-09-18；有效期至：2022-09-18。

17日、9月18日继续施工的情况未制止，施工单位对5#楼地基基础的57号桩孔（成孔）继续施工，现场监理员段某2未及时报告段某1，且参与桩孔旁站监理、成孔验收，段某1未及时书面报告主管部门。

（四）施工安全监管责任单位情况

永德县住房和城乡建设局，经一窗办理，2025年8月12日在系统办理质量安全监督手续，8月14日永德县建设工程质量安全监督站到施工现场进行安全施工措施进行检查。县住房和城乡建设局质量安全监督站2025年8月19日、8月22日、9月1日共4次检查督促。2025年8月22日下发安全隐患整改通知书，要求对4个方面8月29日前改正或解决。永德县住房和城乡建设局2025年9月22日下发〔2025〕-112建设工程停工整改通知书。

经查，2025年9月16日临沧市住房和城乡建设局对永德县书香苑小区二期建设项目进行检查。向永德县住房和城乡建设局下发临住建通〔2025〕9-3-1号（永德县）建设工程质量安全隐患整改通知书，其中涉及施工安全问题5条，要求15日将整改情况上报至临沧市住房和城乡建设局；临住建执〔2025〕9-3-1号（永德县）执法建议书，建议永德县住房和城乡建设局对项目存在的3个违法违规问题进行查处，将查处情况15日内上报；永德县住房和城乡建设局在临沧市住房和城乡建设局2025年9月16-17日到永德县书香苑小区二期项目检查安全生产工作以后，没有把临沧市住房和城乡建设局的要求及时落实到位，没有


把施工安全停工事项实实在在地落实到位，没有及时对项目存在的违法违规行为进行查处。

（五）事故发生经过

2025年9月18日班组长魏某江带领施工人员陈某某、李某杰、杨某、李某汉、杨某涛、胡某云到5#楼地基基础的57号桩孔施工现场施工，后魏某江离开施工现场。旋挖桩施工过程中，于15时30分许，57号桩孔施工至地下约12米（设计深度13米）疑似旋挖到深埋地下的水泥管道，胡某云（系施工单位负责人胡某松之子）让李某杰找来手电筒和杨某一起查看该桩孔，发现已经有渗水现象，发现桩孔水面上漂有水泥块，按照操作流程，渗水后应将该桩孔回填，再打新的桩孔，胡某云即刻向张某辉和胡某松电话汇报情况，张某辉和胡某松回复胡某云再打另一棵桩号。此时混凝土浇筑工杨某提出要到桩孔里面查看，57号桩孔成孔形成，是否可以继续施工。李某杰、胡某云先后两次劝阻杨某无效，此时杨某请求李某汉驾驶起重机（汽车吊）将自己放入桩孔内查看。杨某脚踩在起重机吊钩上、手扶着起重机钢丝绳进入桩孔，李某杰（浇筑工人）在桩孔口帮忙扶着钢丝绳防止吊钩晃动。起重机驾驶员将杨某吊至该桩孔地面往下5-6米处时，杨某突然滑落到桩孔底部，李某杰和胡某云立即请求起重机驾驶员将吊钩放入孔底，并口头呼叫杨某抓住吊钩，杨某第一次抓住吊钩后驾驶员将其吊起约五十厘米，杨某再次坠入孔底，李某杰和胡某云又请求驾驶员将吊钩放入孔底，同时呼叫杨某让其抓住吊钩，杨某声音微弱，至无应答、无反应。随后李某汉立即拨打1

19、120、110呼叫救援，消防救援人员于2025年9月18日15时53分到达现场，经过消防救援人员现场勘查：“桩孔内底部有水，而且水面上没有看见人（杨某）的身影”，17时05分杨某从桩孔底下被救出，但经长时间困在桩孔底部，而且桩孔底部水已经漫过被困人员的头部，经永德县人民医院医护人员抢救无效，17时41分宣布杨某窒息死亡。

（六）事故现场情况

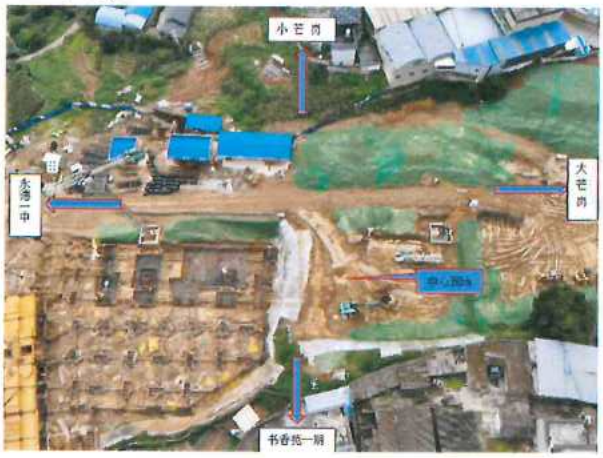

图一 事故现场照片

事故现场位于永德县德党镇的永德县书香苑小区二期建设项目工地内。现场北边是书香苑一期，现场南边是小忙岗寨子，现场西边是小忙岗寨子，现场东边是永德县一中。中心现场位于该项目5#楼施工工地内，中心现场北边是工地边坡，中心现场南边是建筑工地内部道路，中心现场西边是6#楼建筑工地，中心现场东边是4#楼建筑工地。中心现场内有一直径96cm、深约12米的圆柱形桩孔，孔口及孔内壁光滑，孔底有积水。

（七）人员伤亡情况

杨某，男，汉族，年龄27岁，户籍地：云南省临沧市云县，云南远雄建设有限公司员工，永德县书香苑小区二期项目工地旋挖桩混凝土浇筑工人（泥工），在事故中死亡[17]。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故直接经济损失为128万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月18日15时40分，事故发生后，现场人员15时47分分别拨打119、120、110等求助电话，15时53分消防救援局到达现场开展救援，其他救援力量先后到达现场，16时30分县消防救援局报县应急管理局，县应急局立即向县委、政府报告，同时报告市应急管理局。

接到报告后，县委、政府立即组织相关救援力量开展救援。

（二）事故现场应急处置情况

2025年9月18日15时40分，事故发生后，县委、政府立即组织消防救援、卫生、应急、公安、住建、德党镇人民政府等相关救援力量对被困人员杨某进行救援，杨某于17时05分从桩孔内被救出，经永德县人民医院医护人员抢救无效，17时41分宣布杨某窒息死亡。处置期间共出动救援车辆5辆，参与救援及处置人员60余人。

---

17 1.经永德县人民医院诊断，杨某于2025年9月18日死亡，开具《居民死亡医学证明（推断）书》一份，死亡原因：窒息。

2.永德县公安局制作：（永）公（司）鉴（尸检）字〔2025〕012号法医学尸体检验记录、关于杨某死亡情况的调查情况，证明死者杨某尸表伤情符合狭窄空间擦伤，排除他杀可能。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，县委、政府高度重视，立即成立善后处置工作组，做好协商赔偿、死者家属安抚等事故善后工作。经云南远雄建设有限公司与死者（杨某）家属双方协商，2025年9月20日签订赔偿协议书，双方自愿达成赔偿协议，事故善后处置工作得到妥善处置。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，消防救援、卫生、应急、公安、住建、医疗救护以及属地政府相关部门单位及时赶赴现场实施应急救援和现场处置，自事故发生到被困人员救出，处置有序，未造成社会不稳定因素和不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

永德县书香苑小区二期项目旋挖桩基施工人员杨某，在5#楼地基基础57号桩孔施工过程中，未严格执行《旋挖钻孔灌注桩专项施工方案》《起重机械操作规程》第7点[18]。未进行通风检测、无安全防护措施，违规“使用固定吊载运人员”冒险进入桩孔，导致其跌落桩孔底部窒息死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.永德县合兴房地产开发有限公司对施工单位、监理单位管理不到位，公司制定的安全管理制度流于形式，日常的安全检查

18 《起重机械操作规程》第7点 严禁各种起重机吊运人员用手抓挂钩升降，以防起重系统突然失灵而发生事故。

不细致，停工整改期间未及时发现和纠正安全管理方面存在的漏洞和问题。

2.云南远雄建设有限公司现场安全管理缺失，建设项目的专职安全员不在岗不到位，使用未持有安全管理资质的人员上岗作业。安全教育培训不到位，工人入场三级安全教育培训不实，安全技术交底落实不到位，导致作业人员安全意识淡薄，违规使用固定吊载运人员。

3.云南吉吉鑫项目管理有限公司对施工项目部关键岗位人员到岗履职情况、安全检查整改等工作监督不力；未及时发现并制止施工单位违反其下达的施工暂停令；未能及时发现和纠正施工单位未配备持证专职安全管理人员的情形。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.云南吉吉鑫项目管理有限公司：2025年9月16日云南吉吉鑫项目管理有限公司向云南远雄建设有限公司下达工程暂停令，要求1#-5#栋号9月17日7时暂停施工，云南远雄建设有限公司9月17日、9月18日5#栋号旋挖桩继续施工，云南吉吉鑫项目管理有限公司监理员段某2到施工现场开展监理工作，并在9月17日、9月18日参与5#楼21个桩孔的验收，段某2未及时报告项目总监制止云南远雄建设有限公司施工，云南吉吉鑫项目管理有限公司存在监管不力。未按照规定参与组织危大工程验收的行为（塔吊安拆方案），违反了《危险性较大的分部分项工

程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十一条[19]第一款的规定。

2.云南远雄建设有限公司：一是未按照旋挖钻孔灌注桩专项施工方案第六章第（三）节第3项中规定，遇到特殊地质异常情况，立即停止当前区域的连续施工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[20]第一款的规定；**二是**未组织应急救援演练，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[21]第一款第（四）项之规定；**三是**未能有效制止和纠正违章、冒险作业、违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[17]第一款第（六）项之规定。

3.永德县合兴房地产开发有限公司：永德县合兴房地产开发有限公司未按照规定委托具有相应勘察资质的单位对危大工程进行第三方监测的行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条第一款："对于按照规定需要进行第三方监

19《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。

20《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全。

生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

21《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。”

（二）有关监管部门

永德县住房和城乡建设局：对辖区内建筑施工单位安全生产监督力度不够，对监督项目存在的安全生产问题重视不够，针对发现的安全生产问题未采取有力措施督促整改落实，对生产经营单位违法违规行为未及时依法依规查处，监管不到位。2025 年 9 月 16 日临沧市住房和城乡建设局对永德县书香苑小区二期建设项目进行检查。向永德县住房和城乡建设局下发临住建通〔2025〕9-3-1 号（永德县）建设工程质量安全隐患整改通知书，发现永德县书香苑小区二期建设项目存在一下问题：本工程施工至基坑工程和主体工程施工阶段，根据国家住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024 版）存在重大事故隐患，现场反馈建设、施工、监理单位负责人员，要求本工程停工整改存在质量安全隐患，否则后果自负。其中涉及施工安全问题 5 条，要求 15 日内将整改情况上报至临沧市住房和城乡建设局；临住建执〔2025〕9-3-1 号（永德县）执法建议书，建议永德县住房和城乡建设局对项目存在的 3 个违法违规问题进行查处，将查处情况 15 日内上报；永德县住房和城乡建设局在临沧市住房和城乡建设局 2025 年 9 月 16 日到永德县书香苑小区二期项目检查安全生产工作以后，没有把临沧市住房和城乡建设局的要求及时落实到位，没有把施工安全停工事项实实在在地落实到位，没有及

时对项目存在的违法违规行为进行查处。

（三）地方党委政府

德党镇人民政府：属地监管责任落实不到位。永德县书香苑小区二期项目开工以来，德党镇人民政府对施工现场开展安全生产检查不到位。未能有效防范安全生产风险，遏制生产安全事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经事故调查组调查取证，对事故现场进行勘查、查阅资料、制作询问笔录，建议认定永德县书香苑小区二期建设项目“9·18”事故为一起一般生产安全责任事故，对有关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）对责任单位的处理建议

1.永德县合兴房地产开发有限公司：永德县合兴房地产开发有限公司未按照规定委托具有相应勘察资质的单位对危大工程进行第三方监测的行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条第一款：“对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。”的规定。建议依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十九条[22]第（四）项、《云南省住房和城乡建设行

22 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十九条 建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：
（一）未按照本规定提供工程周边环境等资料的；
（二）未按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的；
（三）未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的；
（四）未按照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的；
（五）未对第三方监测单位报告的异常情况组织采取处置措施的。

政处罚裁量适用规定（试行）》，由住房和城乡建设局对永德县合兴房地产开发有限公司予以处罚。

2.云南吉吉鑫项目管理有限公司：施工监督责任未履职到位，未按照规定参与组织危大工程验收的行为，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十一条[15]第一款的规定，建议依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条[23]第（三）项、《云南省住房和城乡建设行政处罚裁量适用规定（试行）》由住房和城乡建设局对云南吉吉鑫项目管理有限公司予以处罚。

3.云南远雄建设有限公司：一是未按照旋挖钻孔灌注桩专项施工方案第六章第（三）节第3项中规定，遇到特殊地质异常情况，立即停止当前区域的连续施工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[15]第一款的规定；**二是**未组织应急救援演练，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[16]第一款第（四）项之规定；**三是**未有效制止和纠正违章、冒险作业、违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五[16]条第一款第（六）项之规定。导致发生1人死亡的一般生产安全责任事故，对该事故的发生负有安全管理主要责任，建议

23 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条 监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：
（一）未按照本规定编制监理实施细则的；
（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的；
（三）未按照本规定参与组织危大工程验收的；
（四）未按照本规定建立危大工程安全管理档案的。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[24]第一款第（一）项之规定，由应急管理部门对云南远雄建设有限公司予以处罚。

（二）对责任人的处理建议

1.杨某：云南远雄建设有限公司混凝土浇筑工，云南远雄建设有限公司在建的永德县书香苑小区二期项目中违规、冒险作业，违反安全操作规程的行为，造成1人死亡的一般生产安全责任事故。在此次事故中负有直接责任，鉴于当事人在此次事故中死亡，建议免予追责。

2.胡某松：云南远雄建设有限公司主要负责人，对本单位安全生产工作重视不够。一是建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；二是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；三是未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[25]第（一）、（五）、（六）

---

24 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

25 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

项之规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[26]第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[27]第（一）项之规定，由应急管理部门对胡某松予以罚款。

3.张某辉：云南远雄建设有限公司永德县书香苑小区二期建设项目的项目经理。一是未组织或者参与本单位应急救援演练；二是未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；三是未能有效制止和纠正违章、冒险作业、违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[16]第（四）、（五）、（六）项之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[28]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[29]第（一）项之规定。由住房

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

26《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

27《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

28《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

29《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；

和城乡建设局暂停张某辉安全生产考核合格证书；由应急管理部门对张某辉予以罚款。

4.李某琴：云南远雄建设有限公司专职安全生产管理人员，未按规定履行安全生产管理职责，只在公司挂名，实际未到岗履行安全员的工作职责，违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第三十三条[30]的规定，建议由住房和城乡建设局按照有关规定处理。

5.李某2：云南远雄建设有限公司专职安全生产管理人员，未按规定履行安全生产管理职责，只在公司挂名，实际未到岗履行安全员的工作职责，违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第三十三条[26]的规定，建议由住房和城乡建设局按照有关规定处理。

6.魏某江：云南远雄建设有限公司永德县书香苑小区二期建设项目旋挖钻孔灌注桩分部工程负责人（旋挖桩班组组长）。未能有效制止和纠正违章、冒险作业、违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[16]第（六）项之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[22]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[23]第（一）项之规定，对由

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

30 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第三十三条 专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处1000元以上5000元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

应急部门魏某江予以处罚。

7.段某1：云南吉吉鑫项目管理有限公司高级工程师，未按照规定参与组织危大工程验收的行为，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十一条[15]第一款的规定，建议依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条[18]第三项、《云南省住房和城乡建设行政处罚裁量适用规定（试行）》，由住房和城乡建设局对段某1予以处罚。

8.段某2：云南吉吉鑫项目管理有限公司监理工程师，未按照规定参与组织危大工程验收的行为，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十一条[15]第一款的规定，建议依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条[18]第三项、《云南省住房和城乡建设行政处罚裁量适用规定（试行）》，由住房和城乡建设局对段某2予以处罚。

9.李某汉：云南远雄建设有限公司起重机驾驶员，违规使用起重机吊载人员，违反了起重机械操作规程。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[31]之规定，由云南远雄建设有限公司给予批评教育或者依照有关规章制度给予处分。

（三）对监管部门的处理建议

31《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

县住房和城乡建设局、德党镇人民政府管理职责落实不到位，建议县人民政府对县住房和城乡建设局、德党镇人民政府进行约谈，深刻汲取事故教训，切实压实安全生产责任。

六、事故主要教训

基于事故经过，现梳理形成以下事故主要教训，聚焦责任落实、监管效能、现场管理、应急处置：

（一）学习领会习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述不认真不深刻，风险意识薄弱。党的十八大以来，习近平总书记高度重视防范化解重大风险，几乎逢会必讲，要求各级党委、政府把自己职责范围内的风险防控好，不让小风险演化成大风险，不让局部风险演化成区域性风险或系统性风险；要求把眼睛瞪得大大的，防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。面对此次事故中的突出问题，剖析可得出根子还是出在思想认识上，一些领导干部不认真学习领会习近平总书记重要论述，没有结合实际认真研究和排查身边的风险，对风险熟视无睹、视而不见，不知敬畏、不晓利害。汲取这次事故的教训，首先要从思想上自我革命，切实增强风险意识、底线思维，真正从思想上始终绷紧安全这根弦，切实把确保人民生命安全。

（二）企业主体责任悬空，安全管理沦为“形式主义”，是事故发生的根本教训。安全岗位形同虚设，责任落实严重缺位。企业违规使用“挂靠安全员”，未安排具备资质、履职能力的安全管理人员驻场开展日常监管，导致现场安全风险识别、隐患排

查、违规行为制止等关键环节完全失控。桩孔渗水这一重大安全隐患出现后，无专业人员评估风险、强化管控，为违规作业提供了可乘之机。漠视监理指令，违规冒险施工。在监理公司已下发停工令的情况下，企业未执行停工要求，反而继续推进桩孔施工及验收工作，公然违反安全生产管理规定，反映出企业对安全规程、监管指令的极端漠视，将施工进度置于人员安全之上，最终引发悲剧。安全培训流于表面，作业人员安全意识淡薄。死者杨某作为混凝土浇筑工，无视桩孔渗水的风险和“回填旧桩孔”的合规指令，执意违规进入桩孔，且采用“脚踩起重机挂钩、手扶钢丝绳”的极度危险方式作业，体现出其缺乏基本的安全常识和风险敬畏心；同时，李某杰、胡某云等现场人员虽有劝阻，但未采取强制制止措施，反映出全员安全责任意识不足、应急处置边界不清的问题，根源在于企业未开展有效的安全培训和责任交底。

（三）监管与监理履职不力，“层层失守”加剧事故风险，是事故蔓延的关键教训。主管部门监管“走过场”，检查整改闭环失效。住房和城乡建设局16日刚完成检查，18日即发生事故，说明检查工作存在“重形式、轻实效”的问题——未发现桩孔施工、安全员缺位、漠视停工令等核心隐患，发现问题后未跟踪整改落实情况，未形成“检查—反馈—整改—复核”的闭环管理。监管频次与实际效果严重脱节，未能及时堵塞安全漏洞，丧失了事故预防的最后机会。党委、政府属地监管责任落实不到位。当

地党委、政府未履行好安全生产属地管理职责，对辖区内工程项目的安全生产状况底数不清、监管不力，未能督促企业、主管部门、监理单位各司其职，导致监管链条出现“真空地带”，未能及时发现并纠正企业违规施工、监理失职等问题。监理公司“监而不管”，未坚守安全底线。监理公司作为工程安全的重要监管力量，既未落实停工令要求、制止违规施工，反而参与违规桩孔的验收工作，属于典型的履职缺位、失职失责。监理单位未严格执行“发现隐患—下发指令—跟踪复查—制止违规”的工作流程，纵容了企业的冒险作业行为，加剧了事故发生的必然性。

（四）企业现场应急处置不科学，错失黄金救援期，是扩大事故后果的直接教训。企业应急救援能力严重不足，处置方式存在明显失误。事故发生后，现场人员未采取科学的救援措施。应急准备流于形式，未制定针对性预案并开展演练。企业未针对桩孔施工可能发生的坠落、溺水、窒息等事故制定专项应急救援预案，也未组织作业人员开展应急演练，导致现场人员在突发事故时手足无措，缺乏有效的救援思路、方法和装备，最终未能挽回死者生命。制度执行与风险管控“双重失效”，暴露了安全生产管理体系的系统性缺陷。安全制度“挂在墙上、说在嘴上”，未落地生根。企业虽有“渗水后回填旧桩孔”的操作流程，但未明确违规作业的制止措施、责任追究机制；监理有停工令制度，主管部门有检查制度，但均未得到有效执行，反映出安全生产制度缺乏刚性约束，成为“一纸空文”。风险预判与管控能力薄弱，

未能防范“小隐患”演变为“大事故”。

此次事故的核心教训在于，安全生产必须坚守“责任不悬空、监管不缺位、执行不打折、应急不慌乱”的底线，任何环节的形式主义、履职不力、意识淡薄，都可能将作业人员推向危险边缘；唯有压实企业主体责任、强化行业监管部门和属地管理部门监理效能、提升全员安全素养、完善应急处置机制，才能从根本上防范同类事故再次发生。

七、事故整改和防范措施

为吸取永德县书香苑小区二期项目“9·18”一般安全生产责任事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）云南远雄建设有限公司要吸取事故教训，举一反三，必须压实安全生产主体责任。加强员工纪律和安全生产教育，执行安全教育培训计划，增强安全意识。要加强对工地的工程安全管理，特别是对一线的安全生产责任制和安全操作规程落实情况进行管理，加强检查巡查，坚决杜绝“三违”行为。

（二）县住房和城乡建设管理部门要结合职能职责，按照“谁主管、谁负责”的原则。认真履行职责，强化日常监管和隐患排查力度，对非法违法建设行为要充分运用法律手段予以查处，及时发现和消除事故隐患，防止类似事故发生。

（三）德党镇人民政府要按照“属地管理”的原则。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，要针对此起事故暴露出来的问题，强化对建筑施工安全的宣传教育工作。

对辖区内在建工程项目进行全面摸底调查，积极开展在建工程领域专项安全整治，及时发现并严厉查处建筑施工建设违法违规行为。

（四）相关职能部门要加强安全生产教育培训和宣传工作。督促生产经营单位严格落实本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并做好相关安全防护措施，增强建筑施工行业从业人员安全意识和自我保护意识，杜绝“冒险作业、违章指挥、违章操作”等行为。

永德县人民政府“9·18”事故调查组

2025年11月19日
